

111 年 清洗水塔、蓄水池工程

蘭 雅 國 小

照 片

施工廠商：安可環保有限公司
施工日期：111 年 8 月 19 日

水質檢驗報告

樣品編號:110819-3

單位名稱:臺北市士林區蘭雅國民小學


地址:臺北市士林區磺溪街57號

飲用水水質標準限值			2NTU 以下	6.5~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	
採樣地點	採樣日期	採樣時間	濁度	PH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	結果評估
蓄水池清洗後	111/08/19	13:30	0.16	7.1	60	0.58	0	■合格 □不合格
~以下空白~								
※檢驗結果:NA 表示未檢測。 ※本報告數據僅供參考，不做正式水質申報。 吳秀美 0937-059951								




客戶名稱：台北市士林區蘭雅國民小學

至真樓上水塔清洗前

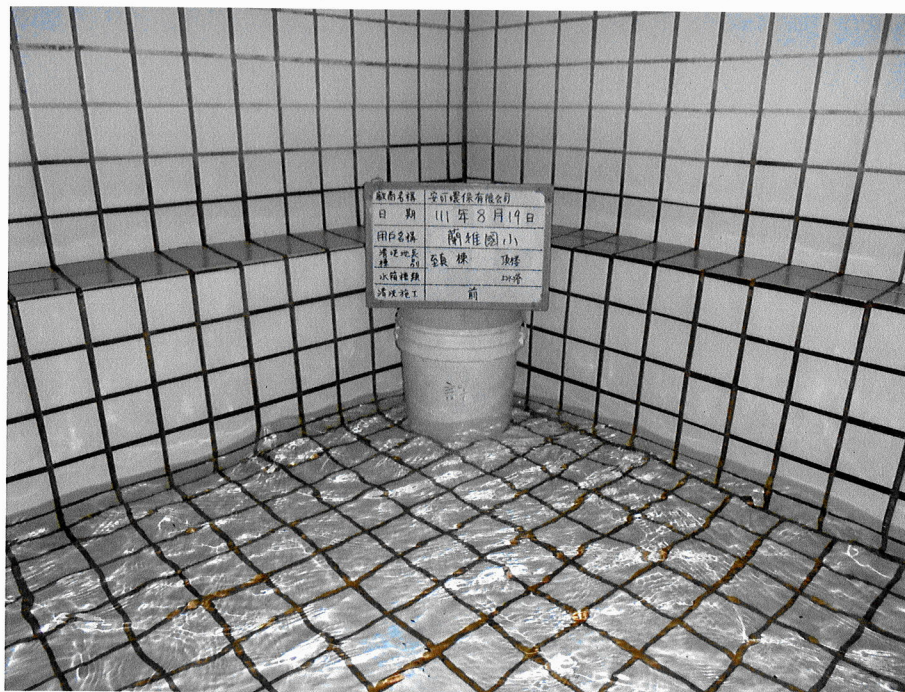

至真樓上水塔清洗後

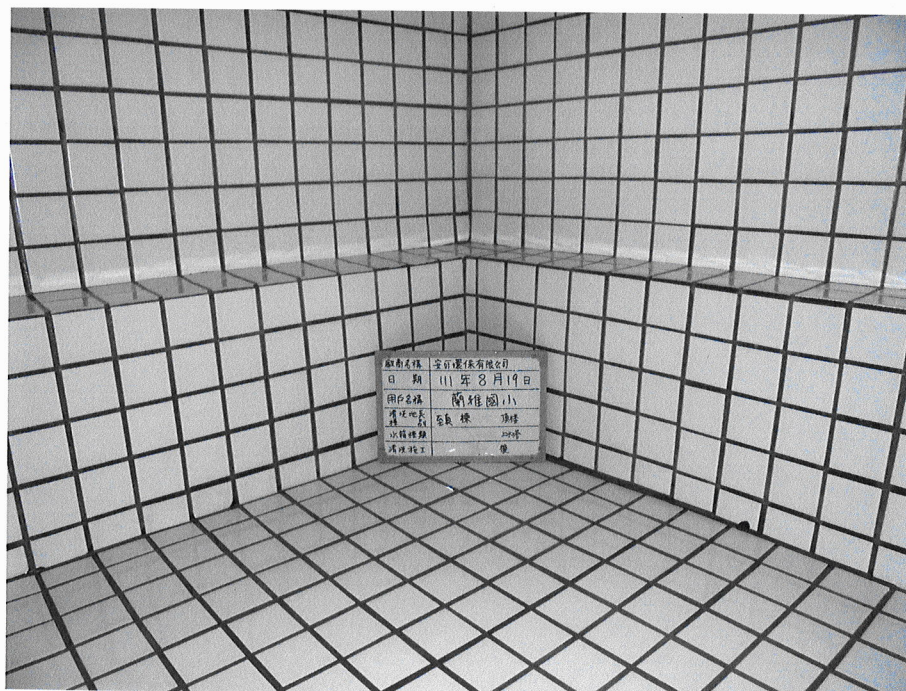


用戶地址		台北市士林區磺溪街 57 號			
用戶基本資料		水池共 1 座，水塔 2 座	場所名稱	蘭雅國小	水號
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： _____ 編號： 3-1 ☐ 頂樓地面 ☒ 位頂樓地上 1 層 ☐ 其他 _____			
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP			
	容 量	容量:L _____ W _____ H _____ (m) 50 噸			
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他 _____			
	結 構 體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水塔或管線併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備			
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____			
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽			
	溢 排 管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管			
	通 氣 管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管			
內部狀況		☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 鋼筋裸露生鏽 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕			
水 質 評 估		(飲用水水質標準 0.2~1.0 mg/L); 清洗前餘氯量： _____ mg/L; 清洗後餘氯量： 0.58 mg/L			
建議改善事項					

客戶名稱：台北市士林區蘭雅國民小學

至誠樓上水塔清洗前




至誠樓上水塔清洗後

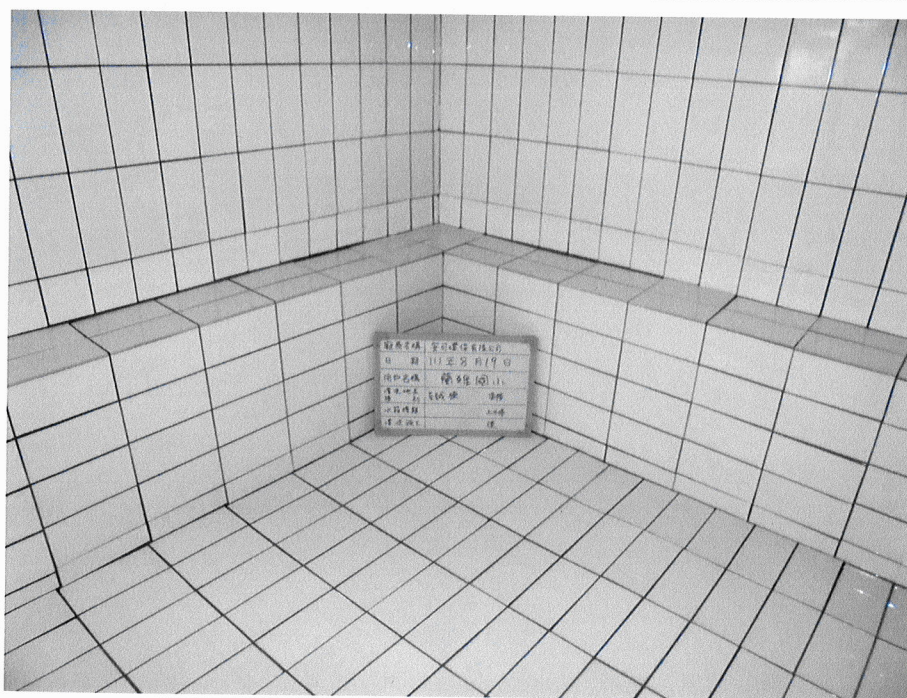


用戶地址		台北市士林區磺溪街 57 號			
用戶基本資料		水池共 1 座，水塔 1 座	場所名稱	蘭雅國小	水號
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 編號： 3-2 ☐ 頂樓地面 ☒ 位頂樓地上 1 層 ☐ 其他			
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP			
	容 量	容量:L W H (m) 56 噸			
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他			
	結 構 體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水塔或管線併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備			
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他			
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽			
	溢 排 管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管			
	通 氣 管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管			
內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕				
水 質 評 估		(飲用水水質標準 0.2~1.0 mg/L); 清洗前餘氯量: mg/L; 清洗後餘氯量: 0.58 mg/L			
建議改善事項					

客戶名稱：台北市士林區蘭雅國民小學

下水池清洗前

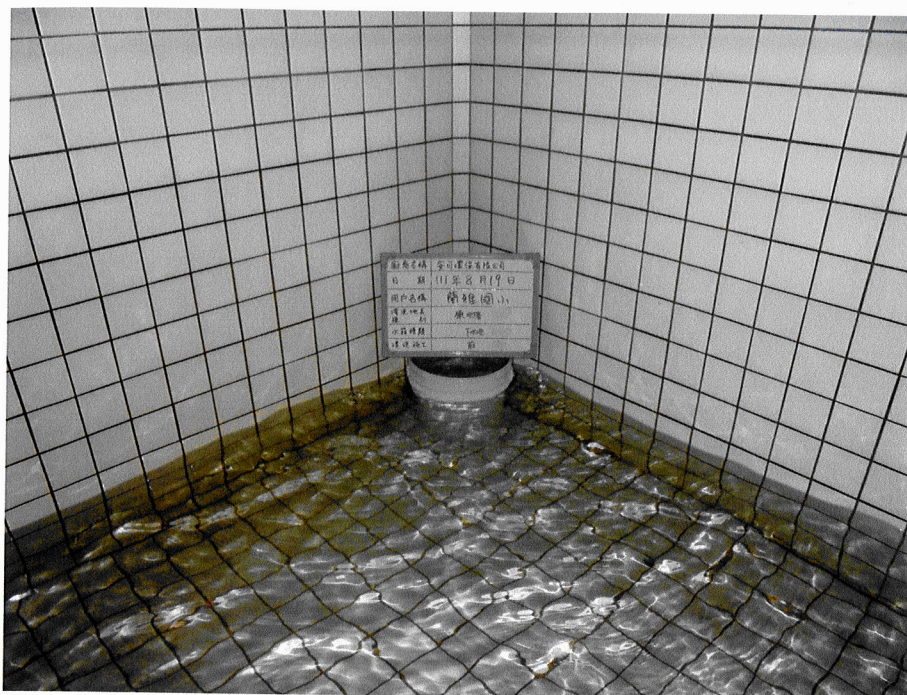

下水池清洗後

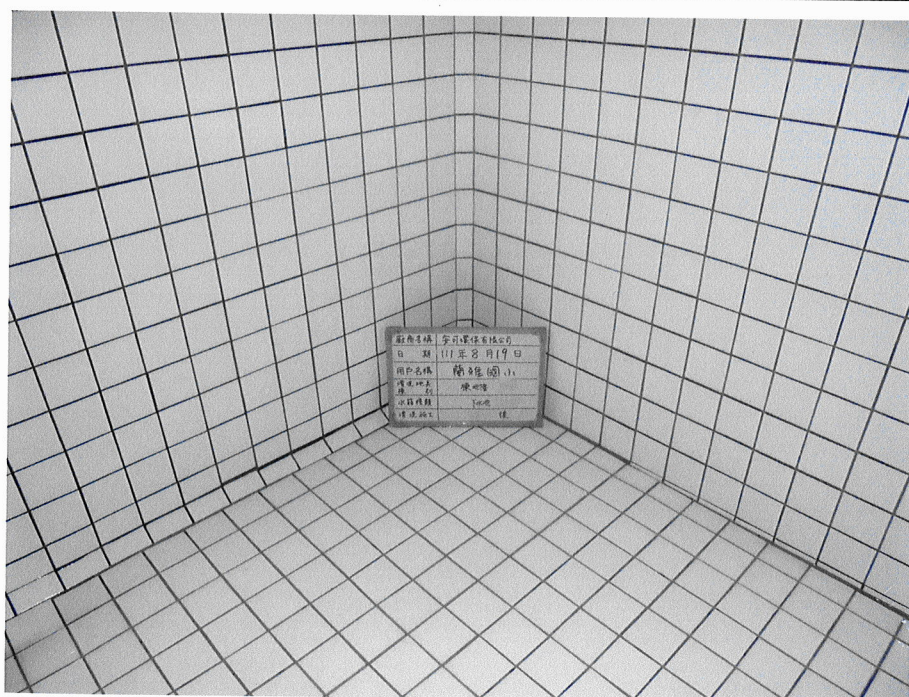

用戶地址	台北市士林區磺溪街 57 號			
用戶基本資料	水池共 1 座，水塔 1 座	場所名稱	蘭雅國小	水號
位置樓層	棟別或地點： 編號： 3-3 ☐ 一樓地面 ☒ 地下 B1 層 ☐ 其他			
結構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP			
容 量	容量：L W H (m) 120 噸			
周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 4 積水 ☐ 6 設於地面(板)下 ☐ 其他 ☐ 5 污水管由內部或上方通過 ☐ 6 與外牆未隔離 ☐ 6 與污水池或化糞池相鄰			
結 構 體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水池併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備			
頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他			
人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽			
溢 排 管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管			
通 氣 管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管			
內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 沉水幫浦銹蝕 ☐ 10 鋼筋裸露生鏽 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕			
水 質 評 估	(飲用水水質標準 0.2~1.0 mg/L); 清洗前餘氯量： mg/L; 清洗後餘氯量： 0.58 mg/L			
